Giftr

Scrum oversigt:

2 sprint
Sprint 1: 07/04 -> 12/04
Sprint 2: 12/04 -> 17/04

Sprint 1 review og retrospektiv mandag d. 13/04
Sprint 2 review og retrospektiv fredag d. 17/04

Project owner:
Scrum master:
Developer:
Developer:

Backlog sprint 1

Planning Poker
User Stories
Risikoanalyse
Scrum Rollefordeling

Få sat tables op og forbered til at begynde at kode

Planning Poker:

1.Oprette ønskeliste (16, 32, 32, 8) – 32.
2.Oprette brugerprofil (16, 8, 16, 4) – 16.
3.Logge ind (8, 8, 4, 4) – 4.
4.Tilføje ønske (navn, link, pris) (16, 16, 32, 16) – 16.
5.Redigere ønske (16, 16, 8, 4) – 16.
6.Slette ønske (8, 8, 4, 8) – 8.
7.Vise ønskeliste via delt link (8, 8, 8, 16) – 8.
8.Reservere ønske (16, 16, 32, 32) – 16.
9.Indstille ønskeliste som privat/offentlig (4, 4, 4, 4) – 4.

Vi har gennemført Planning Poker for vores forskellige user stories og de funktioner, der skal implementeres i forbindelse med dem. Til formålet brugte vi en skala med fordoblende tal (1, 2, 4, 8, 16 osv.), hvilket gav os mulighed for både at skelne mellem små og store kompleksiter samt tydeligt at identificere de mest udfordrende funktioner.

- Processen bestod af to runder, hvor vi i anden runde nåede frem til enighed efter nogle meget brugbare og konstruktive diskussioner. Disse diskussioner gav os indsigt i både usikkerheder og potentielle udfordringer ved de enkelte funktioner, hvilket gjorde det muligt at afstemme vores vurderinger mere præcist.

De fleste af funktionerne endte på et gennemsnitligt kompleksitetsniveau, hvilket passer godt til vores forventede arbejdsmængde. En enkelt funktion fremstod som mere kompleks end de øvrige, men den blev vurderet som den vigtigste funktion for ønskelisten.

Efterfølgende gennemgik vi risikoen forbundet med at implementere alle funktioner inden for den allokerede tid. Dette gav os et tydeligt overblik over, hvilke funktioner der er realistiske at prioritere i det første sprint, og hvilke funktioner der kan vente til det næste sprint. Konklusionen blev, at de vigtigste funktioner både er kritiske for projektets succes og tidsmæssigt overskuelige at implementere, mens nogle af de yderligere funktioner vil blive genovervejet og planlagt til sprint 2. Denne tilgang har givet os både et overblik over kompleksitet og risiko, samtidig med at vi har sikret, at projektets kernefunktionalitet kan leveres inden for de fastsatte tidsrammer.

https://www.mannaz.com/da/artikler/projektledelse-agile-principper/planning-poker-effektiv-estimering-i-agile-projekter/

User Stories

1. Som bruger vil jeg kunne oprette en ønskeliste, så jeg kan samle mine ønsker ét sted.
2. Som bruger vil jeg kunne oprette en konto, så jeg kan gemme mine ønskelister.
3. Som bruger vil jeg kunne logge ind, så jeg kan få adgang til mine ønskelister.
4. Som bruger vil jeg kunne tilføje et ønske (navn, link og pris), så andre kan se, hvad jeg ønsker mig.
5. Som bruger vil jeg kunne redigere et ønske, så mine ønsker altid er opdaterede.
6. Som bruger vil jeg kunne slette et ønske, hvis jeg ikke længere ønsker det.
7. Som gæst vil jeg kunne se en ønskeliste via et link, så jeg kan finde gaveidéer.
8. Som gæst vil jeg kunne reservere et ønske, så andre undgår at købe det samme.
9. Som bruger vil jeg kunne vælge, om min ønskeliste er privat eller offentlig, så jeg selv styrer adgangen.
10. Som bruger vil jeg kunne få en notifikation, når et ønske bliver reserveret, så jeg ved, hvad der er taget.

Feasibility Study – Gennemgang af funktioner

1. Oprette ønskeliste (32)

Dette er den mest komplekse funktion i systemet. Den kræver oprettelse af relationer mellem bruger og ønskeliste samt håndtering af data i databasen. Funktionen er central for hele applikationen, da mange andre funktioner afhænger af den.

Vurdering: Teknisk gennemførlig, men høj kompleksitet og risiko. Bør prioriteres tidligt og evt. opdeles i mindre dele.

---

2. Oprette brugerprofil (16)

Denne funktion indebærer oprettelse af en bruger i systemet samt lagring af relevante oplysninger. Den kræver databaseintegration og validering af input.

Vurdering: Gennemførlig med moderat kompleksitet. Standardfunktion i de fleste systemer.

---

3. Logge ind (4)

Login-funktionaliteten er relativt simpel og bygger på autentifikation af brugeren.

Vurdering: Lav kompleksitet og lav risiko. Velegnet til tidlig implementering.

---

4. Tilføje ønske (16)

Funktionen kræver, at brugeren kan tilføje data (navn, link, pris) til en ønskeliste. Det indebærer databaseoperationer og validering.

Vurdering: Moderat kompleksitet. Central funktion, som er nødvendig for systemets værdi.

---

5. Redigere ønske (16)

Her skal eksisterende data kunne ændres. Funktionen ligner “tilføje ønske”, men kræver håndtering af eksisterende data.

Vurdering: Moderat kompleksitet. Gennemførlig og logisk udvidelse af tilføj-funktionaliteten.

---

6. Slette ønske (8)

Denne funktion kræver, at et ønske kan fjernes fra databasen.

Vurdering: Lav til moderat kompleksitet. Relativt simpel at implementere.

---

7. Vise ønskeliste via delt link (8)

Funktionen gør det muligt at dele en ønskeliste med andre uden login. Det kræver håndtering af unikke links og visning af data.

Vurdering: Moderat kompleksitet. Kan indebære nogle sikkerhedsovervejelser, men er generelt gennemførlige.

---

8. Reservere ønske (16)

Denne funktion gør det muligt for andre brugere at markere et ønske som “taget”. Det kræver håndtering af status og undgåelse af konflikter (fx to personer reserverer samme ønske).

Vurdering: Moderat til høj kompleksitet. Indeholder risiko pga. edge cases.

---

9. Indstille ønskeliste som privat/offentlig (4)

Funktionen giver brugeren kontrol over synlighed. Det kræver blot en simpel indstilling i databasen.

Vurdering: Lav kompleksitet. Nem at implementere.

Samlet vurdering

De fleste funktioner ligger på et lavt til moderat kompleksitetsniveau og er teknisk gennemførlige. Den største udfordring er funktionen “Oprette ønskeliste”, som er både kompleks og central for systemet.

Projektet vurderes som realistisk at gennemføre, hvis:

- De vigtigste funktioner prioriteres først
- De mest komplekse funktioner opdeles i mindre dele
- Udviklingen planlægges i flere sprints

Samlet set er der en god balance mellem funktionalitet og gennemførlighed, hvilket gør projektet velegnet til iterativ udvikling.

Teknisk og Økonomisk Feasibility

Risikoanalyse

1-5 skala.

Brud på persondata beskyttelse GDPR.

Vi kommer til at håndtere personlige data, såsom adresse, fulde navn, adgangskoder og private e-mail adresser, og vi skal derfor være opmærksomme på at dette IKKE skal lægges, da det kan få alvorlige konsekvenser.

Sandsynlighed: 1 Konsekvens: 5 Score: 5

Vi ser det ikke som at være et sandsynligt problem for os, da vi tager hensyn og forbehold til netop dette. Det er kun os som “admins” der har adgang til al den data og vi er alle troværdige personer.

I tilfælde af at dette sker, kan det dog have fatale konsekvenser for vores side og, i værste tilfælde, os personligt. Vi kan ende med at blive sagsøgt eller tiltalt for brud på GDPR. Derudover skaber det også en hvis utryghed hos vores brugere og hjemmesiden vil i sidste ende blive lukket ned.

Servernedbrud og bugs.

Det kan ske for alle at der simpelthen bare er ting der ikke virker og man kan forberede sig noget så godt på at alt er perfekt, men det er næsten umuligt at undgå et problem eller to. Samtidig har vi vores hjemmeside liggende hos en tredjepart, hvor der kan ske nedbrud i visse tilfælde.

Sandsynlighed: 3 Konsekvens: 4 Score: 12

Vi har vores hjemmeside sat op med Microsoft Azure og vi er derfor ret godt dækket ind, da Microsoft sjældent er nede.
Vi har prøvet så vidt som muligt at helgardere os imod eventuelle bugs, men som sagt så er det næsten umuligt at lave noget hvor der ikke er et par bugs.

Konsekvensen ved servernedbrud er selvfølgelig at brugere mister tillid til os. Det er dog sjældent at ønsker haster, så det burde ikke være det største problem. Bugs derimod kan ende med at være et reelt problem, hvis der er en bug i en essentiel feature.

Klassediagram

Klasser og tilhørende attributter:

Bruger
Bruger-id : int
navn : string
email : string
password : string

Ønskeliste
Ønskeliste-id: int
titel : string
beskrivelse : string
offentlig : boolean

Ønsker
objekt-id: int
navn : string
beskrivelse : string
pris : float
link : string

Reservation
reservation-Id : int
dato : datetime
reserveret : boolean

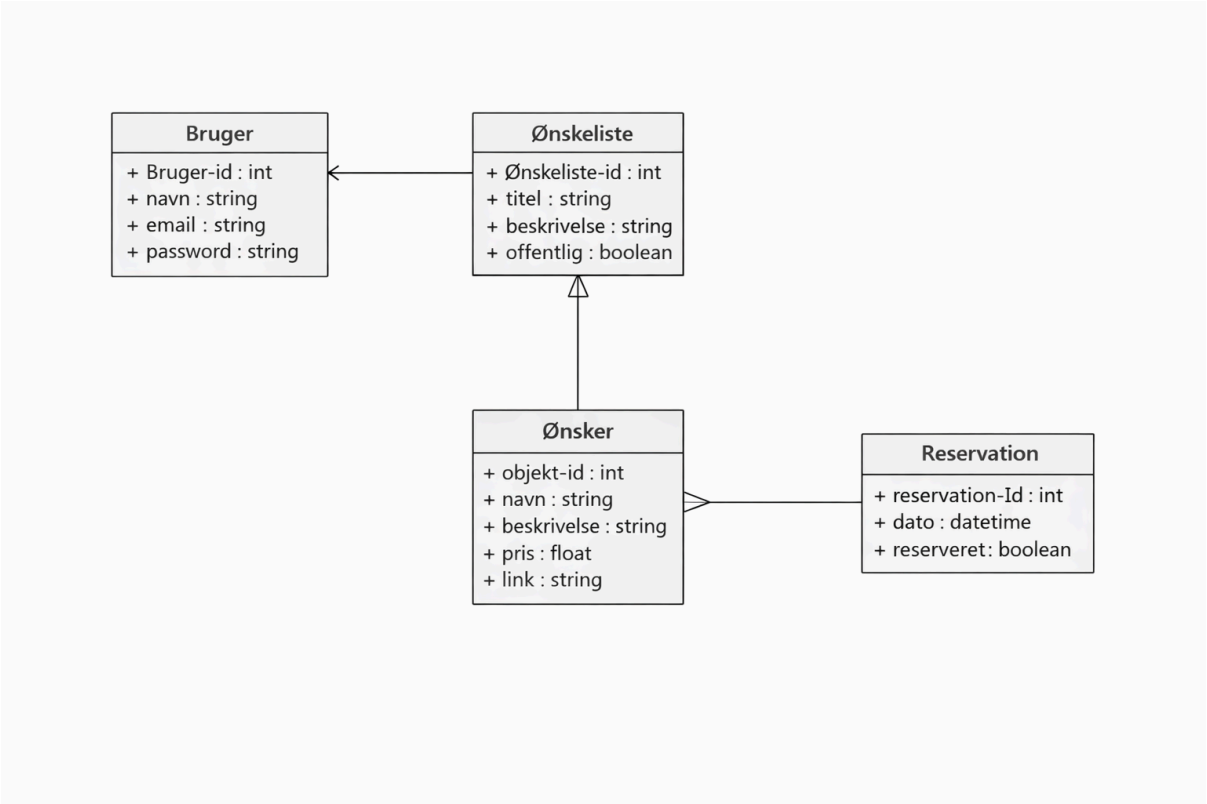

ER Model Diagram

Scrum

Sprint 1 (4 dage):

Dag 1:
Planning Poker
Microsoft Azure opsætning
Klassediagram
Planning
Rollefordeling
User stories

Dag 2:
Daily scrum
Databasehåndtering
SQL opsætning
ER model
Risikoanalyse
Feasibility Study og tilhørende powerpoint

Dag 3:
Daily Scrum online
Layout opsætning af hjemmesiden
Java og Footer

Dag 4
Daily scrum
Kode brugeroprettelse, samt oprettelse af ønskeliste
Index side
Sprint 1 review
Sprint retrospective review

Dag 5
Weekend

Sprint 2 (5 dage):

Dag 1
Weekend

Dag 2
Sprint planning - hvad mangler vi og hvad skal vi lave?

Tilføje/slette/redigere ønsker
Reservere ønsker

Dag 3
Daily scrum
Ønskeliste deling

Dag 4
Daily scrum
Database finpudsning
Sprint review
Sprint retrospective review

Dag 5
DONE

Scrum Log

Sprint 1

Sprint 1 (4,5 arbejdsdage)

Periode: Tirsdag – Fredag + halv mandag

Dag 1 – Planlægning og fundament

På første dagen havde vi fokus på at skabe et solidt fundament for hele projektet. Vi startede med at udarbejde user stories, som gav mening for, hvad hvad vi mener brugernes vigtigeste funktioner og behvov kunne dækkes - derefter lavede vi Planning Poker, hvor vi estimerede kompleksiteten af vores user stories. Dette gav os en fælles forståelse af opgavernes omfang og hjalp med at prioritere arbejdet realistisk inden for sprintets tidsramme.

Herefter opsatte vi vores miljø i Microsoft Azure. Dette indebar oprettelse af database, konfiguration af adgang samt sikring af, at alle gruppemedlemmer havde de nødvendige rettigheder til at arbejde på systemet.

Vi udarbejdede også et klassediagram, som visualiserer systemets struktur og relationerne mellem de forskellige klasser. Dette var vigtigt for at skabe overblik over, hvordan applikationen skulle bygges op i Java.

Dernæst lavede vi en overordnet planlægning af sprintet, hvor vi fordelte opgaverne og fastlagde rækkefølgen af arbejdet. I forlængelse af dette lavede vi en rollefordeling, så alle vidste, hvad deres ansvar var i gruppen.

Afslutningsvis formulerede vi vores user stories, som beskriver funktionaliteten set fra brugerens perspektiv. Disse blev brugt som grundlag for resten af udviklingen.

Dag 2 – Data og analyse

Dagen startede med et Daily Scrum, hvor vi kort gennemgik, hvad vi havde lavet dagen før, hvad vi skulle arbejde på i dag, og om der var nogen blokeringer.

Herefter arbejdede vi med databasehåndtering, hvor vi designede strukturen for, hvordan data skulle opbevares. Vi opsatte SQL-databasen og begyndte at implementere de nødvendige tabeller.

Vi udarbejdede også en ER-model, som visualiserer relationerne mellem databasenhederne. Dette hjalp os med at sikre, at vores database var korrekt struktureret og normaliseret.

Derudover lavede vi en risikoanalyse, hvor vi identificerede potentielle problemer i projektet, såsom tekniske udfordringer, tidsmangel eller integrationsproblemer. For hver risiko overvejede vi mulige løsninger.

Vi arbejdede også med en feasibility study, hvor vi vurderede projektets gennemførlighed både teknisk og ressourcemæssigt. Denne analyse blev præsenteret i en tilhørende PowerPoint, som kan bruges til fremlæggelse.

Dag 3 – Frontend og struktur

Vi startede igen med et Daily Scrum, denne gang online, hvor vi koordinerede dagens opgaver.

Fokus for dagen var på opsætning af layoutet til hjemmesiden. Vi begyndte at strukturere brugergrænsefladen og definere, hvordan siden skulle se ud og fungere.

Derudover arbejdede vi med Java-koden, hvor vi begyndte at implementere grundlæggende funktionalitet. Samtidig udviklede vi en footer til hjemmesiden, som indeholder relevante informationer og bidrager til et mere færdigt og professionelt design.

Dag 4 – Funktionalitet

Dagen startede med et Daily Scrum, hvor vi sikrede, at alle var opdateret og på hvad der skulle ske inden den sidste arbejdsdag i sprintet.

Herefter arbejdede vi med kodning af brugeroprettelse, så nye brugere kan registrere sig i systemet. Vi implementerede også funktionalitet til oprettelse af ønskelister, som er en central del af projektet.

Vi udviklede desuden index-siden (forsiden), som fungerer som indgangspunkt til hele applikationen.

Dag 5 – Review og Retrospective (halv dag)

Til sidst gennemførte vi Sprint 1 Review, hvor vi præsenterede det arbejde, vi havde lavet, og vurderede, om vi havde opfyldt vores mål.

Afslutningsvis lavede vi en Sprint Retrospective, hvor vi evaluerede vores arbejdsproces. Her diskuterede vi, hvad der fungerede godt, hvad der kunne forbedres, og hvordan vi kan arbejde mere effektivt i næste sprint.

Sprint 2

Sprint 2 (4,5 arbejdsdage)

Periode: Mandag – Fredag (inkl. afsluttende buffer)

Dag 1 – Planlægning og videreudvikling

Vi startede Sprint 2 med en Sprint Planning, hvor vi evaluerede status på projektet og identificerede, hvad der manglede at blive implementeret. Vi gennemgik vores tidligere arbejde og besluttede, hvilke funktioner der skulle prioriteres i dette sprint.

Herefter arbejdede vi med funktionalitet til ønskelister. Dette inkluderede muligheden for at tilføje, slette og redigere ønsker. Formålet var at gøre systemet mere dynamisk og brugervenligt, så brugeren nemt kan administrere sine ønsker.

Derudover begyndte vi implementeringen af reservation af ønsker. Denne funktion gør det muligt for andre brugere at reservere en gave fra en ønskeliste, så man undgår dubletter. Dette er en central funktion i systemets værdi.

Dag 2 – Funktionalitet og brugerinteraktion

Dagen startede med et Daily Scrum, hvor vi kort gennemgik fremdriften og fordelte dagens opgaver.

Fokus var på udvikling af funktionalitet til deling af ønskelister. Dette indebærer, at brugeren kan dele sin ønskeliste med andre, eksempelvis via et link eller lignende løsning.

Vi arbejdede med både backend-logik og den nødvendige integration til frontend, så delingen fungerer intuitivt og problemfrit for brugeren.

Dag 3 – Fortsat udvikling

Dagen startede med et Daily Scrum.

Arbejdet fortsatte med videreudvikling og stabilisering af funktionaliteten omkring ønskelister, herunder håndtering, reservation og deling.

Dag 4 – Optimering og evaluering

Vi startede dagen med et Daily Scrum for at sikre overblik over de sidste opgaver i sprintet.

Herefter arbejdede vi med finpudsning af databasen. Dette inkluderede optimering af struktur, relationer og forespørgsler, så systemet bliver mere effektivt og stabilt.

Vi gennemførte derefter et Sprint Review, hvor vi præsenterede de implementerede funktioner og vurderede, om sprintets mål var opnået.

Afslutningsvis lavede vi en Sprint Retrospective, hvor vi evaluerede vores arbejdsproces. Vi identificerede, hvad der fungerede godt, og hvad der kan forbedres fremadrettet, så næste sprint kan blive endnu mere effektivt.

Dag 5 – Afslutning (buffer/halv dag)

Sprintet blev markeret som DONE. Alle planlagte opgaver for Sprint 2 blev færdiggjort, og systemet indeholder nu centrale funktioner såsom håndtering af ønsker, reservation og deling af ønskelister.

Dette markerer en vigtig milepæl i projektet, hvor systemet er blevet væsentligt mere komplet og brugbart for slutbrugeren.

Burn down charts

Sprint 1

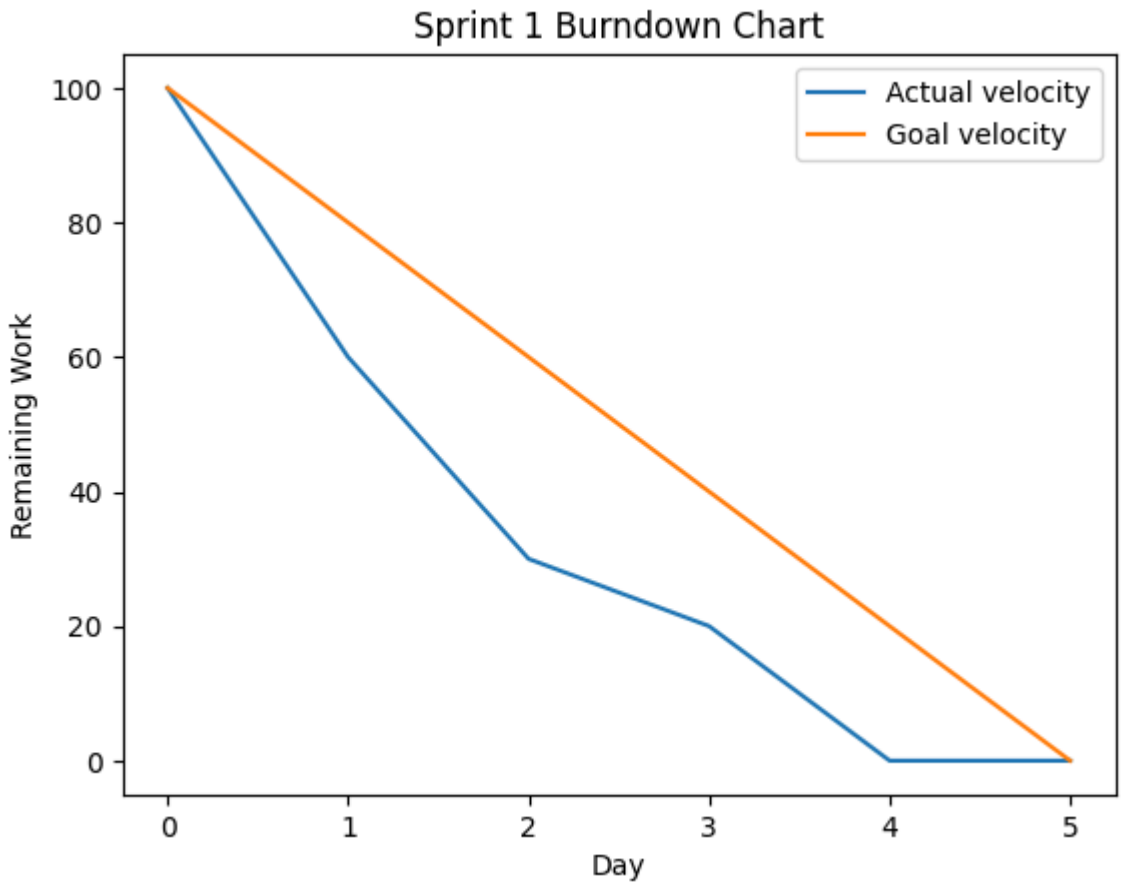

Sprint 2

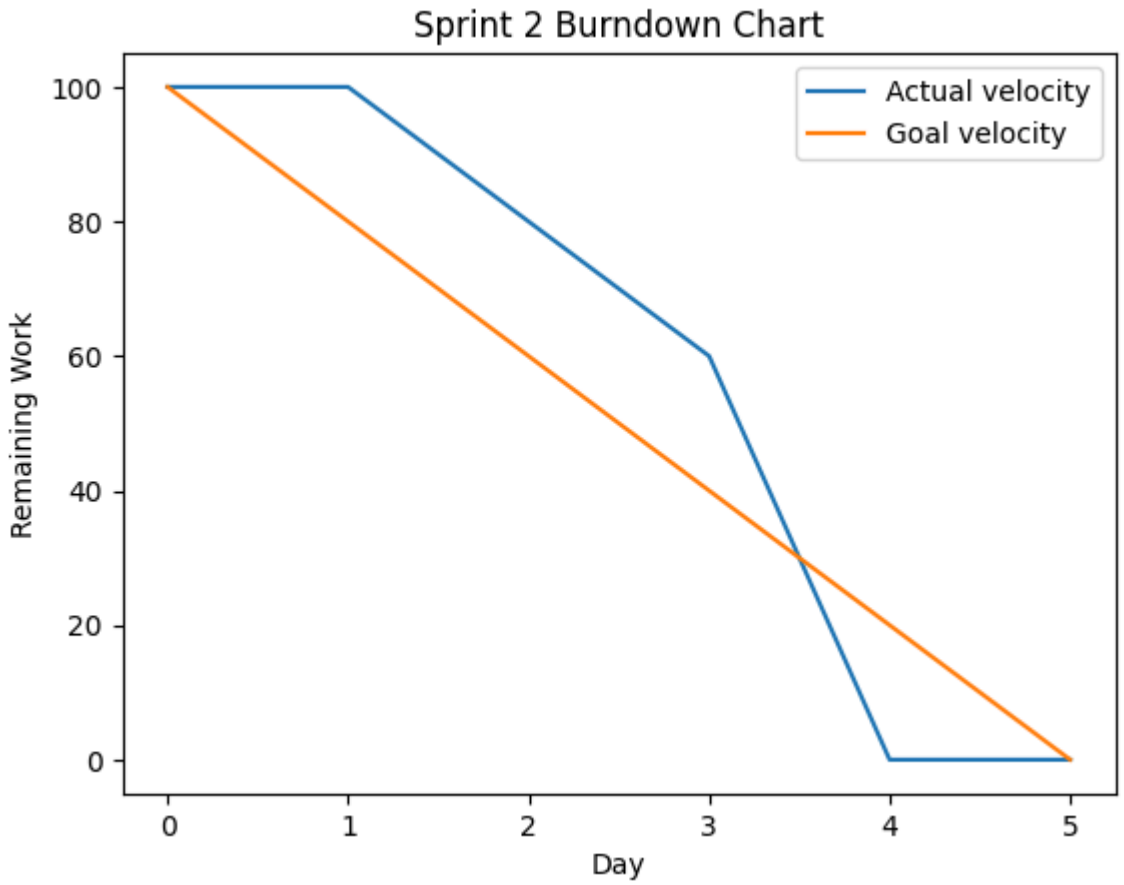
Sprint 2 Burndown Chart
Actual velocity
Goal velocity
Remaining Work
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
Day
